

Relatório de Monitoramento 13º PA - IEF/COMISSÃO TP 51/2021

Belo Horizonte, 14 de maio de 2025.

TERMO DE PARCERIA nº 51/2021 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS E O INSTITUTO EKOS BRASIL

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

13º PERÍODO AVALIATÓRIO

01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE MARÇO DE 2025

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa avaliar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para eventuais resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADA

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática		Indicador		Peso (%)	Metas	Resultados
					13º Período Avaliatório	
1	Operacionalização e Manutenção do PERD	1.2	Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado	20	100%	100%
4	Fortalecimento da Comunicação	4.1	Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD	15	14	59

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Indicador 2.1 - Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado

Área Temática	02 Operacionalização e Manutenção do PERD
Indicador	2.1 Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado
Meta	100%
Resultado	4

Conforme o Programa de Trabalho do TP 51/21, o Indicador **1.2 Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado** visa mensurar o percentual de projetos de arquitetura e engenharia a serem elaborados pela Oscip em relação ao demandado pelo IEF, conforme cronograma a ser apresentado pela Oscip, para cada projeto, a ser aprovado pelo IEF, observando-se a previsão da Memória de Cálculo.

Coerentemente sua fórmula de cálculo é: (Projetos elaborados pela entidade parceira dentro do período avaliado x 100) / Total de projetos demandados pelo IEF com entrega final prevista em cronograma aprovado pelo IEF, dentro do período avaliado.

Conforme Relatório de Resultados do 13º PA (SEI 111450096 apresentado pelo Instituto Ekos, para o presente período avaliatório estava prevista a entrega do projeto de arquitetura e complementares referente a revitalização da área da Prainha do PERD, conforme solicitação demandada pelo IEF, por meio de e-mail enviado ao Instituto EKOS em 12/07/2024.

Conforme o mesmo documento, o cronograma de referência para o acompanhamento deste indicador seria aquele encaminhado no dia 26/08/2024, e aprovado conforme Memorando IEF/COMISSÃO TP 51/2021.nº 13/2024 de 24/09/2024 (Vide Anexo 1).

Conforme cronograma aprovado, a entrega de projetos deveria se dar em março de 2025. No entanto após a contratação de empresa para a realização dos projetos ocorreu que as etapas de desenvolvimento e aprovação do Projeto Conceitual e Anteprojeto demandaram maior tempo de análise e validação entre as partes envolvidas (IEF: GCMUC e DAF/EKOS e CONTRATADA). Assim houve necessidade de alteração do prazo final, a qual foi formalizada mediante solicitação do Instituto Ekos e resposta do IEF em 25/03/2025, mediante Ofício IEF/COMISSÃO TP 51/2021 nº. 6/2025, que alterou a data de entrega final dos projetos para 30/04/2025.

Considerando que a o Programa de Trabalho prevê a possibilidade de repactuação do cronograma:

A Oscip terá 30 dias corridos, a partir da demanda do IEF, para solicitar e sanar os esclarecimentos pertinentes à demanda e apresentar o cronograma envolvendo as etapas de contratação, execução, podendo este ser eventualmente ajustado mediante justificativa a ser aprovada pelo IEF.

Entende-se que esta entrega deverá ser avaliada no PA correspondente ao prazo repactuado, quando enfim deverá ser avaliado o atingimento da meta, e inseridas as análises pertinentes quanto ao processo e ou resultado obtido.

Com relação ao indicador em questão estão em andamento ainda as seguintes demandas, as quais também tem previsão de finalização após o 13º PA:

- Elaboração de projetos de segurança contra incêndio e pânico do PERD
- Projeto de Reforma do Alojamento
- Projeto de reforma de várias edificações do PERD (TR3)

Ressalta-se que as demandas estão sendo devidamente executadas e acompanhadas, e que a relatoria a respeito dos resultados atingidos será realizada no PA em que sua finalização for prevista, conforme cronogramas aprovados.

Finalmente, assim, uma vez que não há previsão de entrega para o 13º PA, entende-se que a meta deve ser considerado o 100% atendida.

Indicador 4.1 - Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD

Área Temática	04 Fortalecimento da Comunicação
Indicador	4.1. Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD
Meta	14
Resultado	59

O Programa de Trabalho do TP 51/21 prevê, para este indicador, metas quantitativas das atividades com relação ao tipo de atividade desenvolvida. Assim, o quadro abaixo apresenta um comparativo das metas previstas e dos resultados obtidos conforme Relatório de Resultados do 13º PA (SEI 111450096 apresentado pelo Instituto Ekos:

Atividade de visibilidade	Meta prevista	Resultados obtidos
Postagens no Instagram	12	56
Matéria sobre o PERD nas mídias Regionais	1	2 releases
Boletim Informativo	1	1
Total	14	59

Com relação às postagens no Instagram o relatório informa que estas motivaram 11.644 curtidas na rede social do PERD e relata a publicação de 339 stories, que embora não foram contabilizados contribuíram para o engajamento dos seguidores. Segunda a análise do relatório, a página do Parque na rede social tem demonstrado assertividade no caminho escolhido, incluindo os aspectos relacionados à identidade visual, o que se reflete num crescimento contínuo de curtidas e interações na rede social. Ainda segundo o relatório, esse engajamento resultou em 456 mil visualizações do perfil do PERD, e no aumento de seguidores de 23.980 (com crescimento de 2580 seguidores neste período).

O relatório relata a elaboração de dois releases, um sobre a 1ª Capacitação para observação de primatas (que grou 4 publicações em veículos da imprensa local/regional) e outro sobre a Seleção pública para empresas de arquitetura e projetos para o PERD (publicados em 3 veículos da imprensa local/regional).

Finalmente, conforme o relatório, foi desenvolvido no âmbito da parceria, o boletim informativo trimestral, que foi enviado e distribuído nas redes sociais do PERD e seu mailing. Nele foram divulgados: Prêmio PERD de fotografia criativa; Primeiro Jazz na Mata; Reinauguração do restaurante do PERD; Programa de voluntariado; 1ª capacitação para observação de primatas; e melhorias na prainha.

Diante do descrito a comissão supervisora entende que a meta foi atingida e inclusive superada, com o evidente fortalecimento da comunicação do PERD e de seu relacionamento com a comunidade/sociedade.

3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática	Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status
2 Fortalecimento da Gestão	2.1 Relatório de execução orçamentária das ações de consolidação do PERD (1ª entrega)	2	31/03/2025	31/03/2025	Plenamente executado dentro do prazo
6 Fortalecimento da Proteção	6.1 Implantar Sistema de Videovigilância (1ª entrega)	3	31/03/2025	31/03/2025	Plenamente executado dentro do prazo
7 Regularização Fundiária	7.3 Estudo de revisão dos limites para a ampliação do PERD (1ª entrega)	2	31/01/2025	30/01/2025	Plenamente executado dentro do prazo
7 Regularização Fundiária	7.3 Estudo de revisão dos limites para a ampliação do PERD (2ª entrega)	2	31/03/2025	-	Pedido de desconsideração
8 Monitoramento da Conservação da Biodiversidade	8.1 Implantação de protocolo de monitoramento do estado da biodiversidade do PERD aos moldes do Programa Monitora do ICMBio (3ª entrega)	2	31/03/2025	26/03/2025	Plenamente executado dentro do prazo

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Produto 2.1 Relatório de execução orçamentária das ações de consolidação do PERD

Área Temática	02 Fortalecimento da Gestão
Produto	2.1 Relatório de execução orçamentária das ações de consolidação do PERD
Previsão de Término	31/03/2025
Término Realizado	31/03/2025
Status	Plenamente executado dentro do prazo

Trata-se da 1ª entrega relativa ao produto, “Documento preliminar da análise de custeio do PERD e das potenciais novas receitas”, que conforme Programa de Trabalho do TP 51/21 deve conter as seguintes informações:

- Levantamento das despesas e custos operacionais do parque, relacionando-as com as diferentes categorias indicadas no modelo SEPLAG e às Áreas Temáticas (ATs) do Termo de Parceria;
- Fontes de receitas efetivas e potenciais, conforme detalhamento anterior.

A primeira versão do documento foi apresentada ao IEF em fevereiro de 2025, sendo a versão final aprovada em 31 de março do mesmo ano, após a consideração da devolutiva do IEF, de modo que a esta entrega foi considerada plenamente executada dentro do prazo.

Esta entrega e principalmente a entrega final do produto são importantes para que o PERD possa subsidiar seu planejamento, tanto considerando a operacionalização da UC, bem como sua consolidação.

Produto 6.1 - Implantar Sistema de Videovigilância

Área Temática	06 Fortalecimento da Proteção do PERD
Produto	6.1 Implantar Sistema de Videovigilância
Previsão de Término	31/03/2025
Término Realizado	31/03/2025
Status	Plenamente executado dentro do prazo

Trata-se da 1ª entrega relativa ao produto, “Videovigilância visando a identificação e monitoramento de focos de incêndio florestal na área do PERD e seu entorno”.

De acordo com o Programa de Trabalho vigente do TP 51/21, deveria constar do relatório em questão:

- Relatoria das tratativas desenvolvidas pela OSCIP;
- Parcerias estabelecidas ou aprofundadas com apoio da OSCIP (incluindo termos celebrados);
- Ações efetivamente implantadas (incluindo relatório fotográfico e coordenadas das câmeras e equipamentos eventualmente implantados);
- Capacitações realizadas, se for o caso;
- Avaliação de benchmarking das possibilidades de implantação de um sistema de videovigilância próprio (se for o caso).

Com relação à implantação do sistema, a atuação da OSCIP se deu grandemente em apoiar o IEF no estabelecimento de acordo de cooperação com a empresa CENIBRA, de modo que a mesma possa otimizar o monitoramento de áreas do PERD em seu sistema de videovigilância, estabelecendo também um protocolo de comunicação que otimize a resposta da equipe do PERD frente aos incêndios florestais.

Esta solução foi considerada a mais viável, haja vista a manutenção ao longo do tempo e a uma atuação já colaborativa entre PERD e Cenibra, com relação à prevenção, combate e controle de incêndios florestais no território, já que as áreas da Cenibra, em grande medida, são limítrofes ao parque.

Durante as tratativas também foram avaliadas a implantação de torres e câmeras suplementares, bem como foram avaliadas outras soluções alternativas, estando toda a relatoria dessas tratativas incluída no relatório e seus anexos apresentado pelo Ekos em 11/03/25 e aprovado pelo IEF em 31/03/25.

O Relatório de Resultados do 13º PA (SEI 111450096) apresentado pelo Instituto Ekos detalha todo o processo, tratativas de encaminhamentos. Dentro da relatoria se destaca o esforço da OSCIP para avaliar e possibilitar a implantação de novas torres, de modo a aumentar a cobertura do sistema da Cenibra, dentre os quais estão as tratativas e minutas de documentos produzidos, relativos a:

- Acordo de Cooperação entre o IEF e a Cenibra para tratar exclusivamente do sistema de videovigilância para prevenção e monitoramento de incêndios florestais;
- Acordo entre o IEF e a empresa NetVale, dona das torres onde podem ser instaladas câmeras PTZ (Jacróá e Dionísio);
- Acordo entre o IEF e a prefeitura de Dionísio, proprietária da área onde se encontra uma das torres da NetVale, a ser utilizada para a instalação de câmera PTZ;
- Acordo entre o IEF e o proprietário das terras situadas no Pico do Jacróá, onde está instalada a outra torre da NetVale, a ser utilizada para a instalação de câmera PTZ.
- Dentro deste esforço, também foram avaliados os cenários de cobertura das câmeras com a utilização do sistema da Cenibra, bem como com a incorporação de torres/câmeras complementares.

Abaixo está apresentado um exemplo de mapa (figura1) com cenário de abrangência de visada das torres da Cenibra, acrescido de possível câmera a ser instalada no Pico do Jacróá.

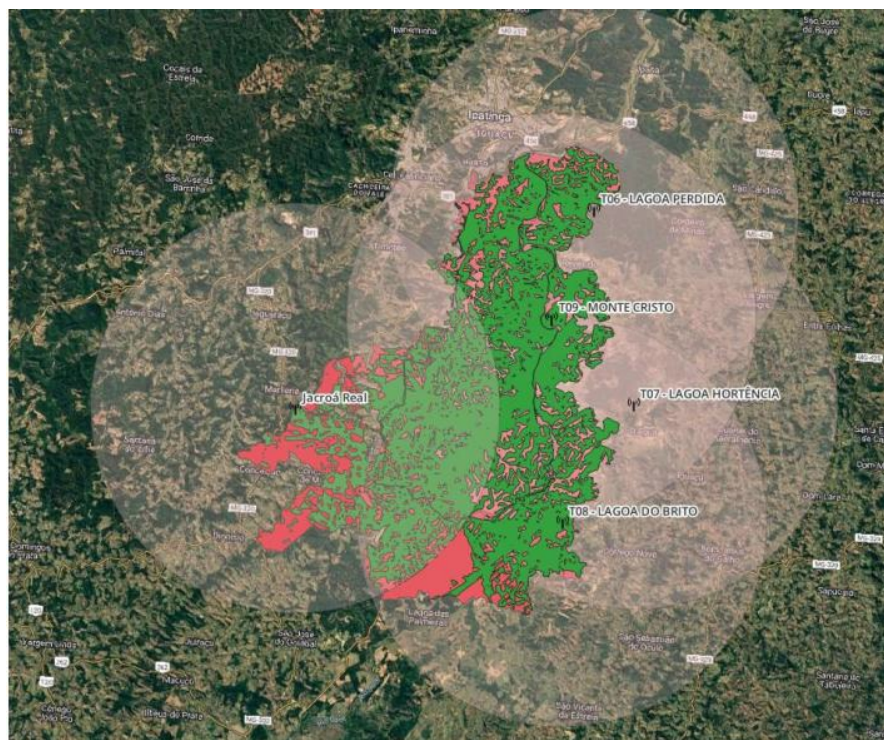


Figura 1: Cenário de cobertura do sistema de videovigilância da Cenibra abrangência de visada das torres da Cenibra, acrescido de possível câmera a ser instalada no Pico do Jacróá. Em verde a área do PERD e sua ZA coberta pelo conjunto de torres/câmeras (68,9% do total) e em vermelho a área fora da cobertura do sistema. (Fonte: Empresa Tera apud Ekos, 2025)

Considerando que a área de cobertura com inclusão de nova torre/câmera no pico do Jacróá abrange 68,9% da área do PERD e sua ZA, não acrescia significativamente a área já atendida pelo atual sistema da Cenibra (52,5 % da área do PERD e sua ZA), e considerando que não estavam previstos no TP os custos relativo a esta implantação e que houve dificuldades em garantir a manutenção do equipamento pela logística da Cenibra, o IEF optou por não absorver este incremento no atual momento, deixando isso em aberto para futuras tratativas com a empresa.

Diante do prolongamento das avaliações e tratativas e da complexidade organizacional da empresa, não foi possível celebrar o acordo com a Cenibra dentro do prazo para a entrega do relatório. É importante esclarecer que o programa de trabalho previa esta possibilidade, definindo que no caso da não celebração da parceria, deveria ser apresentada avaliação de benchmarking com relação a outros sistemas existentes.

Atendendo ao definido no programa de trabalho, o Instituto Ekos realizou a avaliação dos seguintes sistemas de videovigilância contra incêndios:

- 1) Cenibra e Tera (empresa prestadora de serviços)
- 2) ICMBio – Parque Nacional de Itatiaia
- 3) The Nature Conservancy - Parque Nacional de Itatiaia
- 4) Arcellor Mittal;
- 5) Instituto Homem Pantaneiro;
- 6) XPTI (empresa prestadora de serviços do Parque Estadual da Serra do Rola Moça), e Gerência do Parque Estadual da Serra do Rola Moça;
- 7) Suzano Papel e Celulose.

De acordo com o relatório de resultados, que se baseia na entrega realizada, a análise dos vários sistemas de videovigilância concluiu que estes são similares e exigem um investimento elevado para aquisição de equipamentos, sua manutenção e custeio do sistema de Inteligência Artificial associado às câmeras. Além desses custos, também há custos de pessoal envolvido no monitoramento do sistema em tempo integrados.

Assim, optou-se por manter a solução, inicialmente prevista de otimizar o sistema da Cenibra com relação ao monitoramento do PERD por meio de parceria com a empresa.

Para subsidiar as tratativas do acordo foi elaborado um grid preliminar do PERD, para orientar a identificação de eventuais áreas com focos de incêndios florestais (Figura 2), bem como minutado termo do acordo com a Cenibra (encaminhado para análise jurídica do IEF).

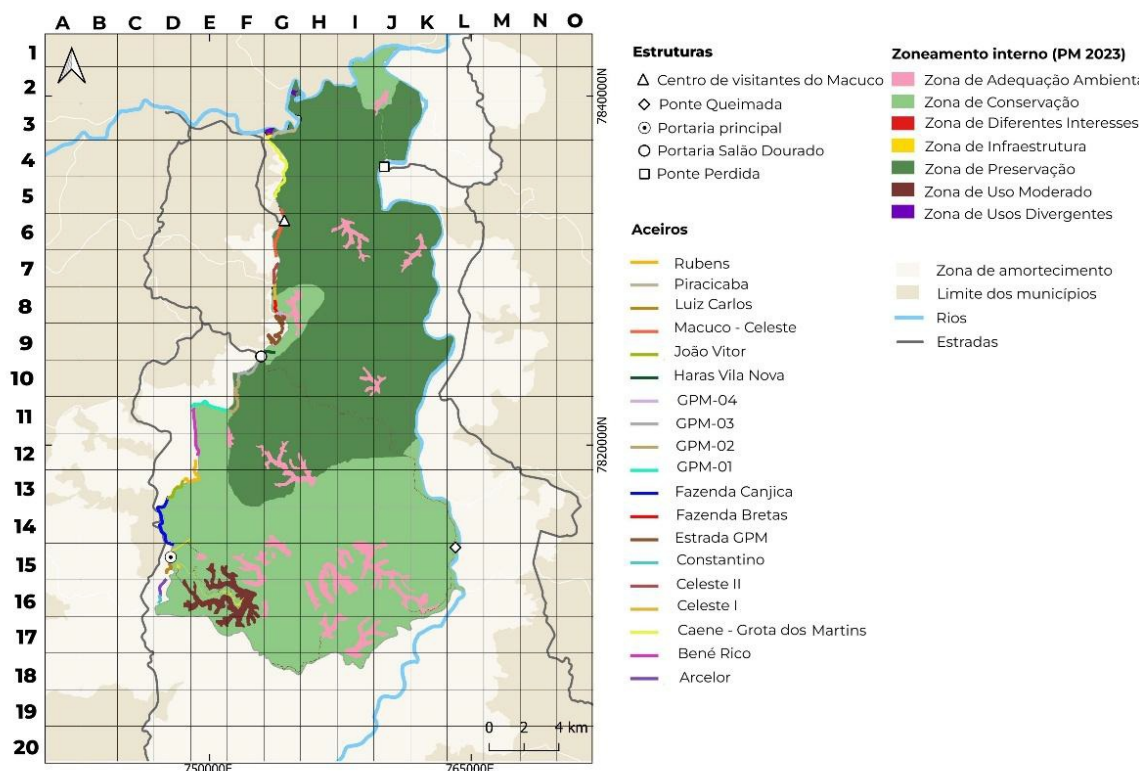


Figura 2: Grid do PERD, considerando quadrantes de referência e trechos do aceiro da UC. Esta sistematização territorial deverá subsidiar a padronização de referências espaciais e o protocolo de monitoramento e comunicação entre IEF e Cenibra.

Considerando todo o exposto, considerando que a entrega atende o programa de trabalho do TP 51/21 e considerando a aprovação pelo IEF dentro do prazo, esta comissão supervisora entende que foram atendidos os critérios de aceitação e a fonte de comprovação desta entrega, devendo a mesma ser considerada plenamente realizada dentro do prazo.

A despeito disso, o Instituto Ekos continua dando o apoio necessário para que o IEF celebre o acordo de cooperação com a Cenibra, e deverá também apoiar o refinamento do Grid de monitoramento do PERD e a definição dos fluxos de trabalho e comunicação, e outras ações para a viabilizar o uso do sistema em questão.

Produto 7.3 - Estudo de revisão dos limites para a ampliação - entrega 1

Área Temática	07 Regularização Fundiária
Produto	7.3 Estudo de revisão dos limites para a ampliação
Previsão de Término	31/01/2025
Término Realizado	30/01/2025
Status	Plenamente executado dentro do prazo

Esta entrega se refere à **Nota Técnica com Análise Preliminar das Áreas Potenciais para Ampliação do PERD**. Integram a Nota Técnica as análises ambiental e fundiária de cada uma das 11 áreas definidas pelo IEF como potenciais à ampliação do Parque e recomendações construídas conjuntamente entre Instituto Ekos e IEF a respeito da potencialidade de cada uma das áreas para ampliação da unidade de conservação.

A Nota Técnica foi precedida de visitas técnicas, levantamentos de dados secundários, análises espaciais, análises fundiárias e ambientais, bem como de diversas reuniões de alinhamento institucional, de modo que o documento pudesse refletir a visão institucional do IEF em função dos diversos aspectos levantados.

Conforme relatório de resultados, a entrega da primeira versão da Nota Técnica foi realizada ao IEF em 20 de dezembro de 2024. Em 06 de janeiro de 2025 o IEF enviou as primeiras devolutivas a respeito do produto, que foram complementadas em 16 de janeiro de 2025, por meio do envio de considerações adicionais do IEF. Em 23 de janeiro de 2025 foi realizada a entrega da Nota Técnica revisada, conforme solicitações do IEF. A aprovação do produto se deu em 30 de janeiro de 2025.

Considerando o exposto esta entrega foi considerada plenamente executada dentro do prazo.

Produto 7.3 Estudo de revisão dos limites para a ampliação - Entrega 2

Área Temática	07 Regularização Fundiária
Produto	7.3 Estudo de revisão dos limites para a ampliação
Previsão de Término	31/03/2025

Término Realizado	Pedido de desconsideração
Status	Plenamente executado dentro do prazo

Esta entrega se refere à Primeira Versão do Estudo de Revisão de Limites para Ampliação do PERD. E foi objeto de pedido de desconsideração, conforme Relatório de Resultados apresentado pelo Instituto Ekos.

Para subsidiar o pedido de desconsideração, o Instituto Ekos traz um histórico do contexto que envolve tanto a regularização da matrícula, quanto da revisão de limites do PERD, bem como de impactos de solicitação de esclarecimentos relativos à prestação de serviços relacionados à área temática 7.

Com relação ao aspecto técnico, primeiramente é necessário apontar que este seria o primeiro desdobramento da entrega anterior que apontou a viabilidade de ampliação do PERD em duas áreas, sendo uma delas uma área ao sul do PERD.

Também é importante entender que durante a avaliação da confrontação do PERD com uma das propriedades ao sul do parque, para fins de regularização da Matrícula nº R.1-6.897 em nome do IEF (produto 7.2), foram identificados vários pontos obscuros que, no entendimento do IEF, não foram esclarecidas pelo Parecer Técnico elaborado pela empresa Espaço Tecnologia, a respeito das Questões Fundiárias em Área Limítrofe (Sobreposição) situada ao Sul do Parque (citado pelo Relatório de Resultados apresentado pela OSCIP). O que levou o IEF a se posicionar no sentido de que o melhor encaminhamento seria o próprio órgão se manifestar sobre seu entendimento sobre estes limites, a partir de sua equipe técnica, o que não tinha sido realizado ainda em 31/03/25.

Diante disso, verificou-se que uma eventual proposta de ampliação na porção sul, sem a compreensão profunda desta situação fundiária poderia aumentar a complexidade do cenário e contaminar todo o processo de ampliação. Por outro lado, em ocorrendo a ampliação, esta já traria ao PERD uma dificuldade de regularização fundiária da área.

Para além do aspecto técnico, o Relatório de Resultados também se refere a uma outra questão que interferiu na execução desta entrega:

Registra-se ainda que, em 28 de janeiro de 2025, o Instituto Ekos recebeu o Ofício IEF/COMISSÃO TP 51/2021 nº 1/2025 solicitando esclarecimentos a respeito da Prestação de Contas do ano de 2023 e solicitando a suspensão dos pagamentos relacionados aos serviços de Regularização Fundiária do PERD, até que os esclarecimentos do Ofício fossem atendidos.

Com os trabalhos de esclarecimentos em andamento, em 12 de março de 2025 o Instituto Ekos enviou ao IEF o Ofício EKOS nº 03 de 2025 informando a suspensão das atividades da empresa Espaço Tecnologia, devido à suspensão dos pagamentos ao fornecedor. O Instituto Ekos informou ainda neste documento os impactos na elaboração e prazos de entrega dos produtos, incluindo aqueles previstos para este período avaliatório e os subsequentes, e consequentemente a necessidade de e consequentemente a necessidade de repactuação dos prazos da Área Temática 07 (referente às entregas e aprovações dos produtos), indicados no 2º Termo Aditivo.

Atualmente o Instituto Ekos respondeu aos questionamentos do IEF, bem como propôs uma revisão do contrato com a empresa.

Para subsidiar estas tratativas, foi encaminhada ao Instituto Ekos manifestação da Comissão Supervisora (Memorando.IEF/COMISSÃO TP 51/2021.nº 1/2025), bem como a devida anuência da Diretoria de Unidades de Conservação do IEF, com proposta de cancelamento das entregas relativas aos produtos 7.3 e 7.4 a saber:

- 7.3 – Segunda entrega - Primeira versão do Estudo de revisão de limites para ampliação do PERD e seus anexos.
- 7.3 – Terceira entrega - Relatoria do processo de consulta pública para revisão dos limites para ampliação do PERD.
- 7.3- Quarta entrega - Estudo de revisão de limites para ampliação do PERD, Mapa, poligonal e memorial dos limites propostos para o Parque, conforme ajuste realizado em função da consulta pública.
- 7.4 – Única entrega - Cadastro Fundiário das propriedades inseridas na proposta da revisão de limites para ampliação do PERD e ainda não regularizadas fundiariamente.

Neste sentido estão sendo finalizadas as tratativas de revisão do contrato, com exclusão das entregas citadas e dos valores relativos a estas. O que também deverá se refletir em futuro aditivo ao TP.

Pelo descrito, a Comissão Supervisora corrobora com a proposta do Instituto Ekos de desconsideração da entrega.

Produto 8.1 Implantação de protocolo de monitoramento do estado da biodiversidade do PERD aos moldes do Programa Monitora do ICMBio

Área Temática	08 Monitoramento da Conservação da Biodiversidade
Produto	8.1 Implantação de protocolo de monitoramento do estado da biodiversidade do PERD aos moldes do Programa Monitora do ICMBio
Previsão de Término	31/03/2025
Término Realizado	26/03/2025
Status	Plenamente executado dentro do prazo

A entrega prevista para este PA é o **Relatório de implementação das unidades amostrais em campo conforme preceitos do roteiro metodológico aprovado pelo IEF**. Especificamente, trata-se do relato da implementação das Estações Amostrais (EAs) previstas no protocolo de monitoramento, e que se baseavam em três grandes transectos (e estruturas associadas), conforme figura a seguir:

Mapa dos transectos

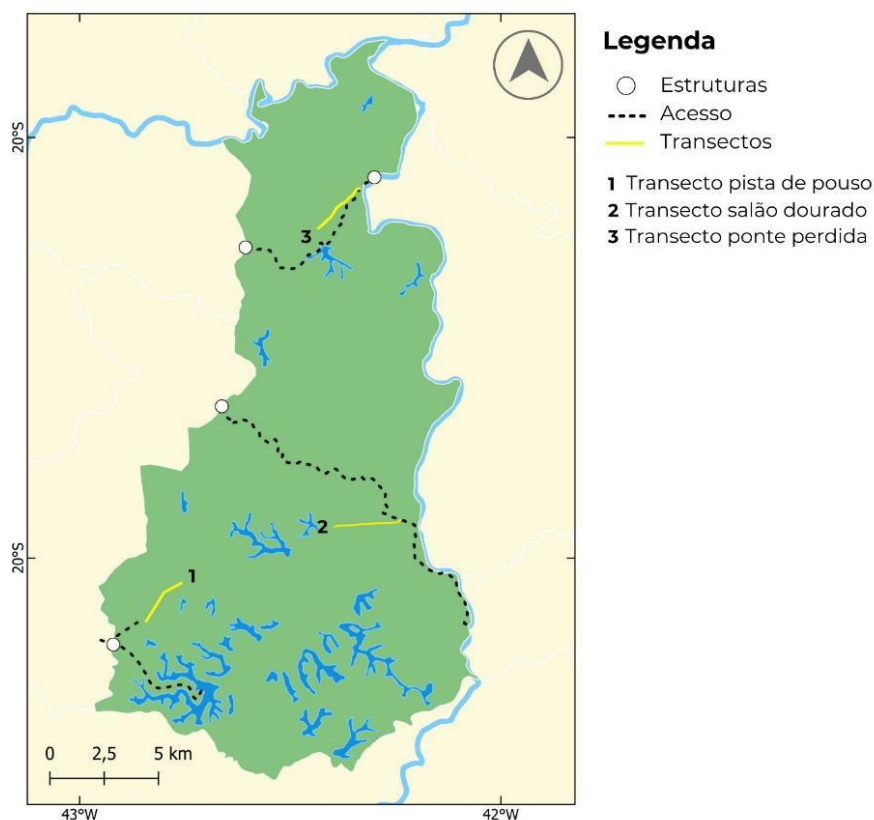


Figura 3. Localização das EAs e suas respectivas estradas de acessos e infraestrutura disponível.(Fonte: Ekos, 2025)

Cada transecto previa a transecção principal e transecções secundárias, conforme metodologia do programa Monitora do ICMBIO, e protocolo previamente aprovado pelo IEF, conforme pode ser visualizado no esquema a seguir:

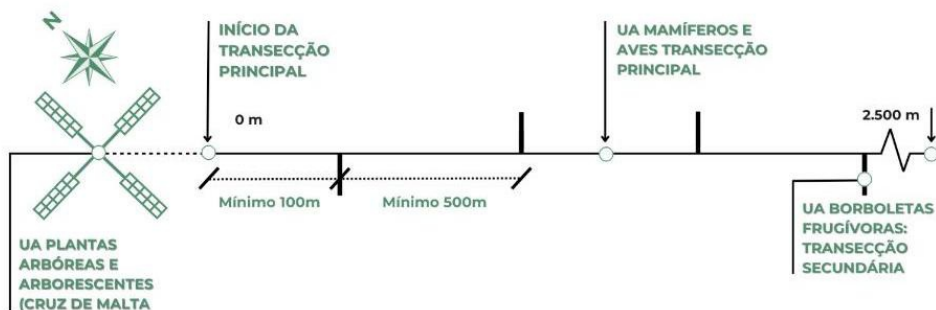


Figura 4 Esquema das Unidades Amostras das estações amostrais para os alvos globais do Componente Florestal (fonte: Ekos 2025)

O Relatório de resultados descreve que houve um grande esforço das equipes de trabalho do PERD para abertura das EAs – Estações amostrais, a tempo de ficarem prontas para o curso que ocorreu entre os dias 10 e 23 de março de 2025. O trabalho de abertura e manutenção das EAs, que antecedeu o curso, necessitou de um elevado número de pessoas e dias de trabalho, em especial por se tratar de um protocolo de Mata Atlântica, subprograma terrestre, que possui as dificuldades do ambiente. Foram mobilizados colaboradores do IEF, Instituto Ekos e MGS para a conclusão.

Ainda de acordo com o Relatório de Resultados, o relatório de implementação foi enviado ao IEF em 18/03/2025, que solicitou alterações em 20/03/2025 e 24/04/2025, que foram atendidas pela OSCIP em 24/03/2025 e aprovado pelo IEF em 26/03/2025.

Diante do exposto a comissão supervisora considera a entrega plenamente executada dentro do prazo.

4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas

13º Relatório Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	4.445.633,71	4.147.132,04	3.776.978,35	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00
(E) Total de Entradas de Recursos	36.979,92	32.620,40	29.909,71	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Sidas de Recursos	335.481,59	402.774,09	352.755,06	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	4.147.132,04	3.776.978,35	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimen
(PP) Provisonamentos de Pessoal	659.106,13	Saldo Extrato C/C	75,12	Transporte de Saldo
(C) Recursos Comprometidos	842.193,32	Saldo Extrato CI 1	2.794.951,75	Transferência para R
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-	Saldo Extrato CI 2	659.106,13	Rendimentos Fin da I
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.952.833,55	Saldo Fundo Fixo	-	Gastos da Reserva
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3.454.133,00	(SF) (-) Saldo Financeiro	3.454.133,00	Saldo
		(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-	

Fonte: Relatório Financeiro - 13º Período Avaliatório (111447557)

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas

13º Relatório Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
Previsto											
1 Entrada de Recursos											
1.1 Repasses	-	1.831.398,93	-	-	1.293.659,60	-	-	1.104.110,60	-	-	784.085,40
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas											
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	-	1.831.398,93	-	-	1.293.659,60	-	-	1.104.110,60	-	-	784.085,40
2 Saída de Recursos											
2.1 Gastos com Pessoal											
2.1.1 Salários	131.404,15	131.404,15	132.552,66	132.552,66	140.602,44	140.602,44	140.602,44	140.602,44	140.602,44	140.602,44	140.602,44
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	114.451,85	114.451,85	107.879,91	107.879,91	114.384,58	114.384,58	114.384,58	115.384,58	114.384,58	114.384,58	114.384,58
2.1.4 Benefícios	37.417,38	37.417,38	37.532,68	37.532,68	39.959,38	39.959,38	39.959,38	39.959,38	39.959,38	39.959,38	39.959,38
Subtotal (Pessoal):	283.273,38	283.273,38	277.965,25	277.965,25	294.946,40	294.946,40	294.946,40	295.946,40	294.946,40	294.946,40	294.946,40
2.2 Gastos Gerais	248.773,34	305.289,46	277.277,80	409.627,80	244.627,80	97.268,80	66.923,80	84.423,80	66.923,80	66.923,80	66.923,80
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	532.046,72	588.562,84	555.243,05	687.593,05	539.574,20	392.215,20	361.870,20	380.370,20	361.870,20	361.870,20	361.870,20
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
Realizado											
1 Entrada de Recursos											
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	36.546,51	32.775,95	31.685,17	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas											
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	308,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	308,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	36.855,42	32.775,95	31.685,17	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Saída de Recursos											
2.1 Gastos com Pessoal											
2.1.1 Salários	86.199,28	103.676,83	102.917,67	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	102.920,78	86.508,58	70.350,20	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 Benefícios	241,73	35.985,23	35.985,23	35.743,50	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (Pessoal):	189.361,79	226.170,64	209.253,10	35.743,50	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Gastos Gerais	105.643,27	118.583,34	165.118,61	687.728,95	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	2.515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	35.830,48	31.922,51	27.911,28	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	333.350,54	376.676,49	402.282,99	723.470,45	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatório Financeiro - 13º Período Avaliatório (111447557)

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas				
13º Relatório Financeiro				
Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades				
Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	325.166,52	68.116,13	20,95%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	190.492,67	438,42	0,23%
3	Manutenção dos azeiros	294.500,00	-	-
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	84.706,34	-
5	Área Temática 1: Despesas com Veículos	73.468,60	15.086,16	20,53%
6	Área Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	-	-	-
7	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	196.920,00	159.586,88	81,04%
8	Área Temática 1: Implantação infraestrutura de Internet	-	-	-
9	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	36.000,00	10.390,00	28,86%
10	Plano de Manejo	-	-	-
11	Sistema de Gestão	-	-	-
12	Relatório de execução orçamentária do PERD	-	-	-
13	Diagnóstico Socioeconômico	-	-	-
14	Programa Monitora	-	31.616,50	-
15	Ações de Uso Público	16.035,00	-	-
16	Implantação do Sistema de Videovigilância	100.000,00	-	-
17	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	-	-	-
18	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário	17.500,00	-	-
19	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-
20	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	27.270,00	799,90	2,93%
21	Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	-	-	-
22	Regularização da Matrícula Nº R1-6.897 do PERD	220.000,00	-	-
23	Estudo de ampliação dos Limites do PERD	500.000,00	-	-
24	Área Temática 1: Aquisição de uniformes	9.900,00	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		2.007.252,79	370.740,33	18,47%

Destinação dos Gastos de Pessoal		
Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal	
Destinação	Valor
Área Meio	68.116,13
Área Fim	302.624,20

onte: Relatório Financeiro - 13º Período Avaliatório (111447557)

4.1. Análise das receitas e despesas no período

Analizou-se as receitas e despesas referentes ao décimo terceiro período avaliatório a partir do Relatório Financeiro - 13º Período Avaliatório (111447557) apresentado pelo Instituto Ekos Brasil à Comissão Supervisora, em 10 de abril de 2024, via processo SEI 2100.01.0011694/2023-03, acompanhado de certidões negativas em âmbitos municipal, estadual e federal, bem como extratos das contas bancárias do Termo de Parceria.

As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informações consolidadas acerca das movimentações financeiras do período.

A tabela 1 apresenta o resumo da situação financeira da Conta do Termo de Parceria, entre janeiro e março de 2025. Dela se depreende que foram transportados R\$ 4.445.633,71 do exercício fiscal anterior, além da entrada de recursos no valor de R\$99.510,03, advindos dos rendimentos financeiros dos recursos do Termo de Parceria na conta de investimentos, conforme definido em norma.

No período foram executados R\$ 1.091.010,74, restando um saldo financeiro de R\$3.454.133,00 nas contas correntes e de investimentos criadas para execução do Termo de Parceria, em 31 de dezembro de 2024. Há que se destacar, ainda na Tabela 1, a existência de provisionamentos de pessoal no valor de R\$ 659.106,13.

Verifica-se que os saldos apresentados na Tabela 1 são condizentes com os extratos bancários apresentados para o mês de março de 2025.

A Tabela 2 e 3 permitem avaliar a realização de despesas em comparação com os valores previstos para o período. Verifica-se que o gasto com pessoal representou 56% dos recursos empenhados no período. A maior parte dos recursos gerais empregados foram destinados à aquisição de materiais e insumos para manutenção de estruturas, os quais estão sendo empenhados na finalização das ações destinadas à recuperação das funcionalidades de todas as estruturas usadas pelo PERD, como centro de pesquisa, casas, alojamentos e áreas de uso público.

Na oportunidade, atestamos que o Relatório Financeiro apresentado pela Oscip parceira seguiu novo modelo recomendado pela SEPLAG.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para além dos produtos e indicadores avaliados anteriormente o TP 51/21 trouxe outros resultados que concorrem para o objetivo do termo, ou seja, para a consolidação do PERD.

O Relatório de Resultados referente ao 13º PA traz uma descrição bem completa de diversas ações em andamento com o engajamento da equipe do TP, no entanto, a seguir serão apontados alguns resultados e /ou ações que se destacaram sob a ótica da comissão supervisora.

Área Temática 1 – Operacionalização e Manutenção: Investimento de cerca de R\$ 143.000,00 em aquisições e contratações. Incluindo: aquisição de materiais e equipamentos para a manutenção das estruturas do PERD, com destaque para o viveiro da UC, aquisição de materiais e insumos para a implantação do protocolo de monitoramento da biodiversidade, e manutenção de veículos.

Área Temática 2 – Fortalecimento da gestão: Ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 foram desenvolvidas atividades de migração da base de dados do PERD para o ambiente Microsoft, aperfeiçoamentos e melhorias nos processos de coleta e armazenamento de dados, assim como criação de painéis para disponibilização de informações em plataforma Power BI. Estas atividades são desenvolvidas conjuntamente com a equipe técnica, administrativa e operacional do PERD, responsável pela coleta e organização dos dados de gestão da unidade de conservação.

Área Temática 4 – Fortalecimento da Comunicação: dentre as diversas ações da comunicação destacou-se a finalização do lay-out do primeiro pacote de placas para o PERD e a elaboração do TR para publicação do Edital para a contratação de sua implantação.

Área Temática 6 – Fortalecimento da Proteção do PERD: Publicação do Edital para aquisição dos equipamentos para compor o sistema de vide vigilância patrimonial do PERD.

Área Temática 9 – Manejo de Espécies para Conservação : Além de continuidade das atividades de coleta de sementes e produção de mudas para o viveiro, destaca-se o monitoramento com relação à predação de animais por onças no entorno do PERD.

Além das ações citadas, estão incluídas diversas ações administrativas e operacionais necessárias para a boa gestão da UC, bem como atuação técnica conforme demanda do PERD, bem como todo trabalho administrativo e financeiro para a viabilização das ações realizadas.

6. CONCLUSÕES

O Termo de Parceria tem atendido seus objetivos principais, considerando os produtos e indicadores avaliados. Para além das entregas definidas no plano de trabalho, com vistas no objeto do Termo de Parceria, a equipe contratada tem apoiado a UC em diversas ações necessárias ao processo de consolidação.

Por fim, cumpre consignar o entendimento desta Comissão Supervisora de que o objeto do presente Termo de Parceria vem sendo gradualmente alcançado pelos esforços conjuntos das entidades parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as metas quantitativas estabelecidas para o período avaliatório em análise.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Ekos Brasil neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

Supervisor do Termo de Parceria

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria



Documento assinado eletronicamente por [REDACTED], Supervisor(a), em 23/05/2025, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por [REDACTED], em 29/05/2025, às 21:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **113576676** e o código CRC **DCFBB720**.
